


☐ -критические работы

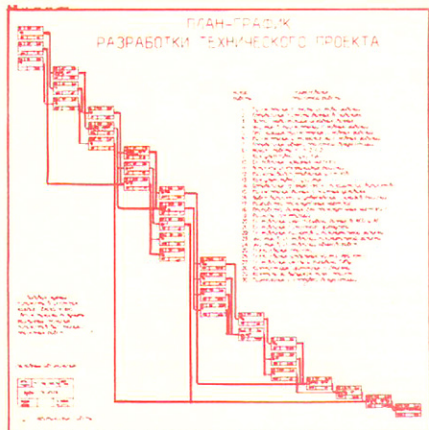

Разработанное программное обеспечение ГРАФСПУ позволяет наглядно представить данные о комплексе работ, последовательности их выполнения, перейти от анализа уже происшедших событий к предсказыванию возможных последствий и, что особенно важно, быстро предоставляет руководителям четкую информацию о ходе выполнения работ.

На графопостроителе могут быть по желанию пользователя сформированы изображения различных традиционных и новых форм календарных план-графиков (диаграмм Ганта, сетевых графиков, ресурсных и стоимостных характеристик, двумерных, трехмерных) и данных о проекте и о рабо-

тах. Система ГРАФСПУ независима от внешних устройств и легко адаптируется для различных прикладных программ формирования и анализа календарных планов.

Для получения изображений план-графиков необходима и достаточна входная информация: номер и наименование работы, матрица предшествующих работ, виды ресурсов, продолжительность работ, количество ресурсов.

Система позволяет идентифицировать критические работы, выделить работы, потребляющие однородные ресурсы, осуществить фрагментацию работы, масштабировать выходную информацию.
